

CRÉATION D'UN LOTISSEMENT RUE DU CLOS ALLETETE À MILLY SUR THERAIN



MAÎTRE D'OUVRAGE



OPAC DE L'OISE
9, AVENUE DU BEAUVAISIS
60 000 BEAUVAIS

MAÎTRE D'ŒUVRE MANDATAIRE



GP ARCHITECTES
873, BLD DE LA RIOLETTE
60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

MAÎTRE D'ŒUVRE COTRAITANT (VRD)



VERDI INGENIERIE SEINE
2, RUE JEAN BAPTISTE GODIN - PAE DU HAUT VILLÉ
60 000 BEAUVAIS

BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - AGENCE DE CREIL
1 RUE DES PRUNELLERS - PARC ALATA
60100 CREIL

CSPS



CETE APAVE
172 AVENUE MARCEL DASSAULT
60 000 BEAUVAIS

Titre / société / lots	Noms	Tel	Mail	Présent	Absent	Diffusion	Convoqué prochaine réunion
MAITRISE D'OUVRAGE							
OPAC de l'Oise Tél : 03 44 79 50 50 Fax : 03 44 06 39 09	M.DEL RIO		fdelrio@opacoise.fr		X	X	
	M. LEMOINE		plemoine@opacoise.fr		X	X	
	M. MERLIN	06.32.91.04.42	amerlin@opacoise.fr	X		X	X
	Mme NICOLAS		cnicolas@opacoise.fr		X	X	
	Mme TOUZARD	03.44.06.39.95	ctouzard@opacoise.fr		X	X	
MAITRISE D'ŒUVRE							
GP ARCHITECTES Tél : 03.44.54.68.67 Fax : 03 44 54 96 45	M. GIRARD	03.44.54.68.67	girarde.gparchitectes@orange.fr		X	X	X
	M. PERONNET	06.84.40.05.38	cperonnet@gparchitectes.com	X		X	X
Verdi Ingénierie Seine Tél : 03 44 48 26 50 Fax : 03 44 48 18 21	M. CALMELET	06.40.21.25.36	vcalmelet@verdi-ingenierie.fr		X	X	
	Mme. CARETTE		mmcurette@verdi-ingenierie.fr	X			X
VILLE DE MILLY SUR THERAIN							
Mairie Rue de Dieppe 60112 Milly-sur-Thérain Tél : 03.44.81.00.22	M.PHILIPPART	06.72.54.46.19	philippart.jj@orange.fr		X	X	
	M. COCAGNE	06.75.31.14.75	mairie.millysurtherain@wanadoo.fr		X	X	
	M. DROUARD	06.80.90.39.57		X		X	
	M. SMET	06.43.38.50.95		X		X	
BUREAU DE CONTROLE							
SOCOTEC Tél : 03.44.63.84.00 Fax : 03.44.53.03.97	M. VALETTE	06 15 28 51 17	Jean-Luc.VALETTE@socotec.com		X	X	X
CSPS							
CETE APAVE Tél : 03.44.45.28.36	M. DELMAS		Olivier.delmas@apave.com		X	X	

Verdi Ingénierie Seine

SIÈGE SOCIAL : 99 rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. 01 42 22 61 22 - Fax 09 72 13 45 66 - seine@verdi-ingenierie.fr
SAS au capital de 37 000 € - SIREN 445 292 790 RCS PARIS - APE 7112B - TVA Intracommunautaire FR 08 445 292 790

AGENCE OISE : ZI du Haut Villé - Rue Jean-Baptiste Godin - 60000 Beauvais - Tél. 03 44 48 26 50 - Fax 09 72 13 45 65
www.verdi-ingenierie.com



CR n°	Contenu			Pour le	Intervenant concerné		
Fax : 06.11.85.12.66							
GEOTECHNICIEN							
FONDASOL	M. RICHE		bertrand.riche@fondasol.fr		X	X	
	M. DUFOUR	03 22 44 62 95 06 15 88 67 56	marc.dufour@fondasol.fr		X	X	
CONCESSIONNAIRES							
VEOLIA EAU SEAO	M. WALLOIS	06.12.17.10.96	arnold.wallois@veolia.com	X		X	
	M. COPE	06.01.28.07.26		X			
ERDF / ENEDIS	M. MONTFOURNY	06.63.16.13.10	mickael.monfourny@erdf-grdf.fr		X	X	
ORANGE	M.KRAUZE	06.87.74.34.52.	herve.krauze@orange.com		X	X	
CAB	Mme GLORIEUX	03.44.10.52.57 06.22.44.30.81	s.glorieux@beauvaisis.fr		X	X	
ENTREPRISES							
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD RN17 GARE - BP11 60 190 ESTREES SAINT DENIS	M. Sébastien NOREL	03 44 10 30 66			X		
	M. Eddy Demeester	06 85 08 66 10	Eddy.DEMEESTER@eiffage.com	X		X	X
LOISELEUR 44 rue Aristide Briand BP 80003 60872 RIEUX cedex	M. LOISELEUR	03.44.71.08.01	loiseleur@groupeloiseleur.com		X		
	M. JOUANIQUE	06 72 26 81 79	cedric.jouanique@loiseleurpaysage.com		X	X	
DEMATHIEU BARD Z.I. de la Pilaterie Rue de la Couture BP 14035 59704 MARCQ EN BAROEUL Cedex Tél : 03.28.32.67.43	M MONNIER	06.21.03.06.92	eric.monnier@demathieu-bard.fr		X		
	M MINEL	06.75.04.53.67	mickael.minel@demathieu-bard.fr		X	X	
	M TINGRY		cedric.tingry@demathieu-bard.fr		X	X	

PROCHAINE REUNION

N°	DATE	HEURE	LIEU	OBJET
20	26/01/2017	14h00	Sur site	Réunion de chantier

Les éléments en **ROUGE** sont ceux ajoutés dans le dernier compte rendu, en l'occurrence n°19

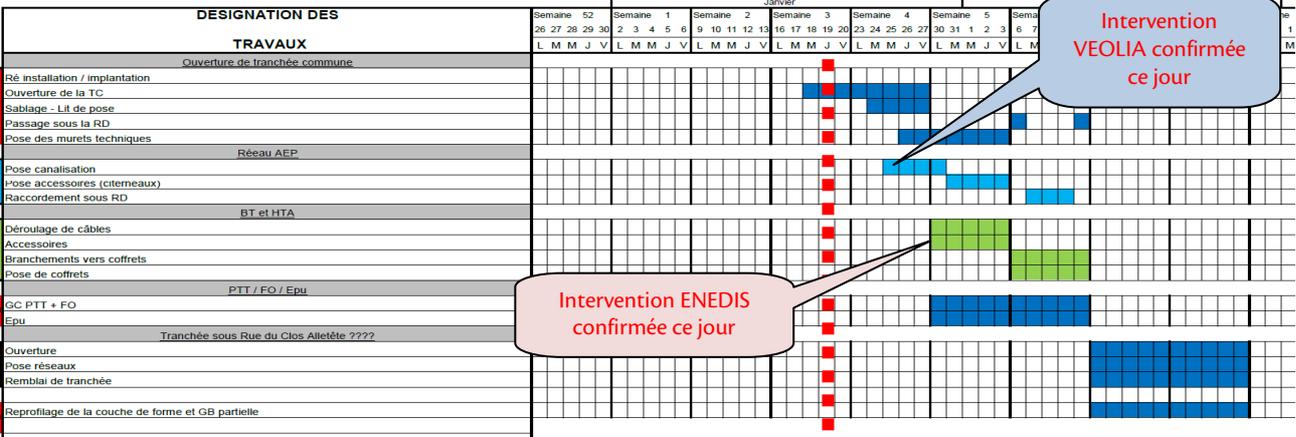
Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s'il n'a pas fait l'objet d'observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier suivant.

R1 : premier rappel,

R2 : deuxième rappel,

R3 : troisième rappel. À l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
OBJET DE LA REUNION			
CR19	Reprise des travaux et point planning.		
OBSERVATIONS SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT			
CR19	Sans objet		
DOCUMENTS REMIS			
CR19	<p><u>EIFFAGE => VERDI ; GPA ; FONDASOL</u></p> <p>Sans objet</p> <p><u>EIFFAGE => TOUS</u></p> <p>Coupe des TC</p> <p>Plan d'EXE des réseaux divers – ind D du 07/11/2016</p> <p>Planning – ind 6</p> <p><u>LOISELEUR => VERDI</u></p> <p>Sans objet</p>	<p>Mail du 13/01/17</p> <p>19/12</p>	
INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR			
CR11	<p><u>ERDF</u></p> <p>Voir pour mise à jour des plans avec optimisation des coffrets CIBE / ReMBT – RAPPEL</p>	27/10/16	ErDF
CR19	<p><u>EIFFAGE</u></p> <p>GPA demande qu'il lui soit transmis les plans d'altimétrie des parcelles, bassin et zone de compensation</p>	26/01/17	Eiffage
CR18	<p>Mettre à jour le planning avec notamment intervention concessionnaires dito décisions du 15/12/2016.</p> <p>Fait</p>	Débit jan. 2017	Eiffage
CR18	<p>Fournir coupe de tranchée commune + obtenir validation des concessionnaires. Fait</p>	Débit jan. 2017	Eiffage
CR17	<p>Faire un retour sur la prestation d'enrobés en remplacement des pavés drainants dans l'avenant. – Sera réalisé sem. 04 au plus tard.</p>	15/12/16	Eiffage
CR11	<p>Fournir plans et notes de calculs RECTOR des Poutres passerelle à SOCOTEC pour VISA. – Fait en attente de retour de SOCOTEC > Verdi relancera</p>	27/10/16	Eiffage
CR10	<p>Fournir les éventuelles mises à jour du dossier EXE de la passerelle à FONDASOL</p> <p>Fournir proposition et fiche technique des murets techniques - Sera transmis sem. 04 au plus tard</p>	PM Oct. 16	Eiffage Eiffage
CR19	<p><u>GPA</u></p> <p>Confirmer l'implantation de coffret pour le 24/01/17 au plus tard</p>	24/01/17	GPA
CR19	<p><u>VERDI</u></p> <p>Relancer SOCOTEC sur le dossier de la passerelle y compris sur le retour effectué par EIFFAGE</p>	26/01/17	VERDI
CR10	<p><u>BUREAU DE CONTRÔLE</u></p> <p>Faire un retour sur le dossier de la passerelle. Pas de retours concernant les poutres malgré les relances.</p> <p>RAPPEL</p>	Oct. 16	Socotec
SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER			
CR3	<p><u>ORDRES DE SERVICE</u></p> <p>Les entreprises ont été notifiées par OS par l'OPAC le 18/04/2016.</p>	PM	

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné															
	<p>EFFECTIFS/INTEMPÉRIES</p> <p><i>Tableau de suivi des intempéries :</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Motif intempéries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/11/2016</td> <td>Pluviométrie</td> </tr> <tr> <td>10/11/2016</td> <td>Pluviométrie</td> </tr> <tr> <td>23/11/2016</td> <td>Pluviométrie</td> </tr> </tbody> </table> <p>PLANNING / AVANCEMENT DES TRAVAUX</p> <p>CR14 Planning mis à jour le 13/01/2017 :</p>  <p>Création: 10/05/2016 Mis à jour le 13/01/2016</p> <p style="text-align: right;">OPAC DE L'OISE / MILLY SUR THERAIN - Tranchées</p> 	Date	Motif intempéries	09/11/2016	Pluviométrie	10/11/2016	Pluviométrie	23/11/2016	Pluviométrie									
Date	Motif intempéries																	
09/11/2016	Pluviométrie																	
10/11/2016	Pluviométrie																	
23/11/2016	Pluviométrie																	
CR19	<p>EIFFAGE indique que le planning ne tiens compte que de la réalisation des TC et qu'il faut intégrer 1 semaine (sem8) pour la réalisation des voiries et Pré-voiries. Mais maintien un départ des équipes EIFFAGE au 24/02/17 au plus tard.</p>																	
CR19	<p>EIFFAGE indique que les coffrets seront posés dans 15 jours soit semaine 06.</p>																	
CR11	<p>EIFFAGE rappelle qu'au vu des conditions difficiles sur site, le planning est amené à être ajusté et à évoluer.</p> <p>Dans un souci de coordination technique et de planning, la tranchée rue du Clos Alletete pour le raccordement réseaux sera réalisée en 2^{ème} phase.</p>	PM																
	<p>MISE À DISPOSITION / RÉCEPTION / DOE</p>																	
CR19	<p>Réalisation des tranchées communes en cours</p>																	
CR18	<p>Substitution et couche de forme terminées. Plateformes bâtiment terminées.</p>																	
	<p>SOUS TRAITANCE</p>																	
CR3	<p>Dans le cas d'une sous-traitance, le titulaire transmettra la demande d'agrément du sous-traitant au MOA. Le MOA dispose ensuite d'un délai de 15 jours pour valider la demande d'agrément.</p> <p><i>Tableau de suivi des sous-traitants :</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Titulaire</th> <th>Prestations</th> <th>Entreprise</th> <th>Inspection commune</th> <th>DC4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EIFFAGE</td> <td>Réalisation d'une passerelle en béton armé</td> <td>BRUYERE</td> <td>FAIT</td> <td>TRANSMIS</td> </tr> <tr> <td>EIFFAGE</td> <td>Assainissement sous vide</td> <td>BARRIQUAND</td> <td>FAIT</td> <td>TRANSMIS</td> </tr> </tbody> </table>	Titulaire	Prestations	Entreprise	Inspection commune	DC4	EIFFAGE	Réalisation d'une passerelle en béton armé	BRUYERE	FAIT	TRANSMIS	EIFFAGE	Assainissement sous vide	BARRIQUAND	FAIT	TRANSMIS	PM	TOUS
Titulaire	Prestations	Entreprise	Inspection commune	DC4														
EIFFAGE	Réalisation d'une passerelle en béton armé	BRUYERE	FAIT	TRANSMIS														
EIFFAGE	Assainissement sous vide	BARRIQUAND	FAIT	TRANSMIS														
CR3																		

D.I.C.T – ARRETES DE CIRCULATION – AUTORISATIONS DE VOIRIE – DEVIATIONS

CR3	D.I.C.T.	Pour le	Intervenant concerné
CR3	<p>Fournir une copie des récépissés de DICT à VERDI.</p> <p>ARRETES</p>	PM	EIFFAGE

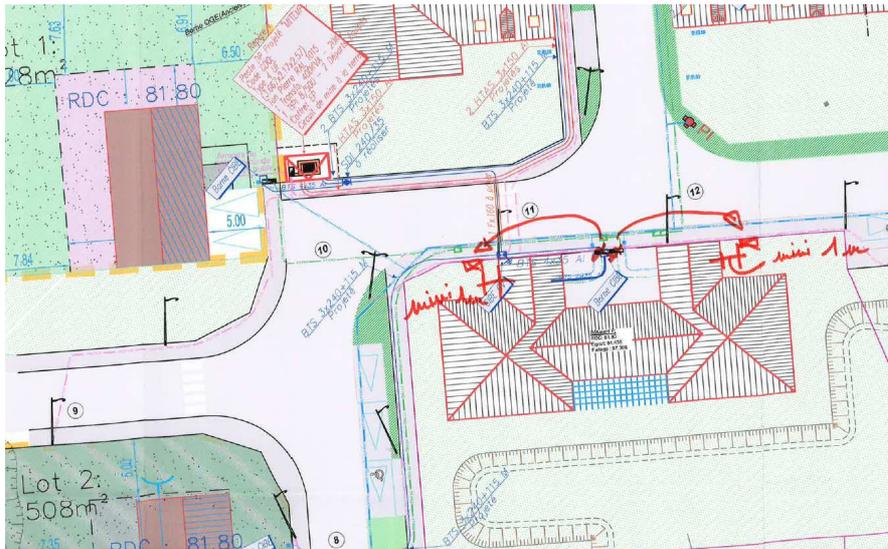
CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
CR19	Verdi demande qu'une copie de toutes les demandes d'arrêtés et/ou de permission de voirie faite et à venir lui soit transmise	À l'avancement	EIFFAGE
CR11	La mairie demande que les livraisons ne cheminent pas par la déviation envisagée ci-dessous lors de la réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete. Pendant la réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete, EIFFAGE indique que la fermeture de la rue sera nécessaire (pour env. 1semaine maximum). Il devra être envisagé la déviation suivante :	PM	Tous
CR4			

HYGIENE – SECURITE – INSTALLATIONS

	<u>INSTALLATIONS DE CHANTIER</u>		
CR3	VERDI rappelle que l'entreprise est tenue de respecter le cahier des charges, notamment en termes de limitation des nuisances (Cf. Chapitre 4.1 du CCTP / Partie : Prescriptions pour limiter l'impact des chantiers sur l'environnement Extrait de la Charte « Chantier vert » -).	Juin 2016	EIFFAGE
	<u>CONSTAT D'HUISSIER</u>		
CR4	EIFFAGE indique qu'un exemplaire du constat d'huissier est à disposition dans la cabane de chantier.	PM	TOUS
CR3	Fournir une copie du constat d'huissier à l'OPAC, la Mairie et à VERDI.	Au plus tôt	EIFFAGE

SUJETS ABORDÉS

	<u>VOIRIE</u>		
CR18	Concernant les tassements de la couche de forme, prévoir d'affiner les mètres cubes de remblais pour le rechargement et voir d'ici fin février si il y a eu évolution par rapport au relevé topo du 12 décembre 2016. Fait, le cubage des remblais en pour le rechargement s'élève à environ à 400m3. Les données seront transmises à VERDI pour la semaine 04.	26/01/17	EIFFAGE
CR17	EIFFAGE informe que la couche de forme+sol support se tassent localement sur environ 10/20cm. Voir l'avis / préconisations de FONDASOL à ce sujet. Les essais de plaques seront réalisés lundi 12/12/2016 => Fait et rapport remis le 12/12/2016 => PF2 atteint sur tous les essais voirie. Au vu du caractère évolutif du sol support, envisager la réalisation de la GB uniquement sur les zones de circulations PL du chantier bâtiment. Détails sur les nivellements en pourtour de bâtiment à voir.	Déc. 16	VERDI / EIFFAGE
CR16	La Mairie indique que la voirie de la RD sera refaite courant 2017 => envisagé par conséquent la réalisation de la traversée avant (avant phase de finition). La mairie rappelle : <i>La mairie demande que les zones susceptible de présenter de l'eau, même en faible quantité (décaissé centrale et berges) soit sécurisée afin qu'aucun enfant ne risque de s'y noyer.</i>	PM	MOE / ENT
		PM	EIFFAGE
CR14	FONDASOL valide la méthodologie en cours relative à la substitution de sol et structure de voirie.	PM	OPAC / GPA / VERDI
CR12	Finaliser la protection et balisage le long du mur (propriété au n°3 rue du clos Alletete). – Fait	PM	EIFFAGE
CR6	RAL 3004 pour les mobiliers urbains et candélabres.	PM	EIFFAGE

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné																																																																	
	<u>ASSAINISSEMENT</u>																																																																			
CR10	Prendre en compte les remarques de Madame GLORIEUX du 02/08/2016 concernant le bassin	PM	EIFFAGE																																																																	
CR5	Prévoir un coude au niveau de la surverse du bassin	PM	EIFFAGE																																																																	
	<u>PASSERELLE</u>																																																																			
CR15	Utilisation de la passerelle possible à partir du 01/12/2016. Pendant la durée des travaux, il sera prévu la mise en place de garde-corps temporaires. Les définitifs seront mis en place à la fin du projet, pendant la phase de finition.																																																																			
	<u>RÉSEAUX DIVERS</u>																																																																			
	GPA demande le déplacement de deux coffrets afin de pouvoir positionner deux places PMR.																																																																			
CR19		PM	EIFFAGE																																																																	
CR18	EIFFAGE indique que le lit de pose et enrobage de la tranchée commune seront réalisés en gravette.	PM	EIFFAGE																																																																	
	Coupe de tranchée commune envisagée (à mettre au propre pour VISA des concessionnaires : Fait et transmis par mail à tous le 13/01/17.	PM	EIFFAGE																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Côté voirie</th> <th>BT</th> <th><-20cm-></th> <th>PTT</th> <th><-20cm-></th> <th>AEP</th> <th><-20cm-></th> <th>EPU</th> <th>Côté bâtiment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"> CR16 EIFFAGE demande qu'une bonne coordination, technique et temporelle, soit prévue avec les concessionnaires pour que leurs interventions se passent au mieux. </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> CR14 La tranchée commune sera réalisée en janvier 2017 (sem. 4 et 5). Veiller à garantir les interdistances réseaux (Cf. NP98 – 332). </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> CR7 La mairie a indiqué par téléphone le 20/07/2016 qu'elle accepte le modèle de candélabre défini au marché. </td> </tr> <tr> <td colspan="9"><u>ENEDIS / ErDE</u></td> </tr> <tr> <td>CR18</td> <td colspan="7">INTERVENTION ENEDIS POUR LE DEROULAGE DES CABLES LE 30/01/2017. Confirmée</td> <td>30/01</td> <td>ENEDIS</td> </tr> <tr> <td>CR19</td> <td colspan="8"> ENEDIS confirme par téléphone la date du démarrage de son intervention. La MOE et EIFFAGE rappel à tous que les travaux d'ENEDIS devront être terminés au 09/02/17 au plus tard. <ul style="list-style-type: none"> • Confirme une livraison du poste en Mars 2017 VERDI a rappelé dans un mail du 15/12/2016 à ENEDIS les points suivants : </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Côté voirie	BT	<-20cm->	PTT	<-20cm->	AEP	<-20cm->	EPU	Côté bâtiment	CR16 EIFFAGE demande qu'une bonne coordination, technique et temporelle, soit prévue avec les concessionnaires pour que leurs interventions se passent au mieux.									CR14 La tranchée commune sera réalisée en janvier 2017 (sem. 4 et 5). Veiller à garantir les interdistances réseaux (Cf. NP98 – 332).									CR7 La mairie a indiqué par téléphone le 20/07/2016 qu'elle accepte le modèle de candélabre défini au marché.									<u>ENEDIS / ErDE</u>									CR18	INTERVENTION ENEDIS POUR LE DEROULAGE DES CABLES LE 30/01/2017. Confirmée							30/01	ENEDIS	CR19	ENEDIS confirme par téléphone la date du démarrage de son intervention. La MOE et EIFFAGE rappel à tous que les travaux d'ENEDIS devront être terminés au 09/02/17 au plus tard. <ul style="list-style-type: none"> • Confirme une livraison du poste en Mars 2017 VERDI a rappelé dans un mail du 15/12/2016 à ENEDIS les points suivants :										
Côté voirie	BT	<-20cm->	PTT	<-20cm->	AEP	<-20cm->	EPU	Côté bâtiment																																																												
CR16 EIFFAGE demande qu'une bonne coordination, technique et temporelle, soit prévue avec les concessionnaires pour que leurs interventions se passent au mieux.																																																																				
CR14 La tranchée commune sera réalisée en janvier 2017 (sem. 4 et 5). Veiller à garantir les interdistances réseaux (Cf. NP98 – 332).																																																																				
CR7 La mairie a indiqué par téléphone le 20/07/2016 qu'elle accepte le modèle de candélabre défini au marché.																																																																				
<u>ENEDIS / ErDE</u>																																																																				
CR18	INTERVENTION ENEDIS POUR LE DEROULAGE DES CABLES LE 30/01/2017. Confirmée							30/01	ENEDIS																																																											
CR19	ENEDIS confirme par téléphone la date du démarrage de son intervention. La MOE et EIFFAGE rappel à tous que les travaux d'ENEDIS devront être terminés au 09/02/17 au plus tard. <ul style="list-style-type: none"> • Confirme une livraison du poste en Mars 2017 VERDI a rappelé dans un mail du 15/12/2016 à ENEDIS les points suivants :																																																																			

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
	<ul style="list-style-type: none"> • Votre intervention est planifiée au 30/01/2017. Un planning en cours d'affinement vous sera communiqué par EIFFAGE. • Merci de nous communiquer le nombre de jours d'intervention. • Il est prévu que vous dérouliez votre câble dans la tranchée sous trottoir côté voirie, la coupe type de tranchée vous sera communiquée par EIFFAGE. • Avez-vous les matériaux à disposition ? Notamment le transformateur. Si oui, pouvons-nous envisager dès à présent la réalisation de la HTA rue du Clos Alletete ? • Confirmer les modalités de raccordements sur la RD - rue de Dieppe (délais, durée, implantation). • NB : Il faut que la tranchée soit remblayée dans les meilleurs délais, au risque de la voir se dégrader très vite (éboulement, remontées d'eaux, ...). De ce fait, les interventions devront se suivre sans interruption, d'où l'importance notamment d'intervenir dès le 30/01/2017. De plus, si l'intervention est interrompue et que la tranchée subit des dégradations pendant cette période d'interruption, la remise en état de la tranchée sera à la charge du concessionnaire ou de son prestataire. 		
CR10	<p>Un point a été fait le 13/10 avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé / rappelé :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Article 2 déposé et validé ⇒ Date de livraison transfo : 3 mois ⇒ Hauteur coffret à 40cm du sol minimum - S'assurer que la hauteur de coffret soit au-dessus de la côte de référence ⇒ Possibilité de mutualiser des S22 avec les REMBT. Auquel cas, adaptation des murets techniques nécessaire ⇒ Prévoir la mise en place d'une cellule EPU dans transfo ⇒ Vérifier implantation HTA au niveau du croisement rue du clos Alletete / RD133 		
CR6	<p>Un point a été fait avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ErDF devra voir pour que la tranchée commune rue du clos Alletete soit réalisée entièrement par EIFFAGE (hors fouille pour raccordement à réaliser directement par ErDF) • Le transformateur devra être posé à une côte mini de 82,00 • Prévoir une armoire dans le transformateur pour l'éclairage public 	13/07/16	ErDF
	<ul style="list-style-type: none"> • ErDF devra valider l'emprise et implantation du transformateur, et voir si nécessité de mettre des marche ou rampe d'accès • Le transformateur sera finition brute • ErDF devra fournir les fiches techniques des coffrets et l'article 2 • Coffrets électriques à fournir en amont à EIFFAGE pour réalisation des murets techniques. • ErDF indique qu'il ne faudra pas que des prises de terre soient situées à moins de 8m du transformateur <p>ErDF demande à être prévu au plus tard 1,5 mois avant intervention.</p> <p><u>Eau potable / VEOLIA</u></p>	Été 2016	ErDF
CR18	INTERVENTION VEOLIA POUR POSE CANALISATIONS AEP DES LE 25/01/2017. Confirmée	25/01	VEOLIA
CR19	Méthodologie d'intervention et de phasage fait ce jour entre EIFFAGE et VEOLIA.		
CR19	<p>VEOLIA indique qu'il compte réaliser les branchements à l'avancement.</p> <p>Objectif : réaliser le tronçon AEP sous la RD début 2017 avant la réfection du tapis de la rue de Dieppe (RD133). La tranchée sera réalisée en tranchée ouverte.</p> <p>VEOLIA informe / alerte sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccordement sur une conduite de transport en DN250 sur la rue de Dieppe. • Cette canalisation alimente plusieurs communes, il sera donc nécessaire d'informer les communes de la coupure environ 3 semaines avant (fait par VEOLIA). • La fosse pour le raccordement devra faire environ 2,00m de long, et à minima la largeur du trottoir. 	PM	Tous ErDF VEOLIA

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
	<p>Phasage d'intervention pour réalisation de la tranchée sous RD :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jour 1 : Terrassements, ouverture et lit de pose Jour 2 : Pose des canalisations AEP, raccordement sur existant, et remblaiement. Durée ½ j. <p>Pour les circulations, prévoir passage avec plaques métalliques et alternat ponctuelle par feux tricolores.</p> <p>Prévoir une réfection de voirie avec structure dito existant avec épaulements de 10cm de part et d'autre à chaque couche de structure. Conformément au guide de remblayage des tranchées du LCPC SETRA, les épaisseurs de matériaux devront être majorées de 10%.</p> <p>Le poteau incendie sera mis en place en toute fin de chantier (phase de finition).</p> <p>Citerneau à poser en première phase.</p> <p>Liaison B (phase de finition) : Prévoir réalisation d'une électro soudure à la sortie du citerneau.</p> <p>Les essais pressio et bacterio seront réalisés après remblais.</p> <p>Éviter la pose du réseau AEP sous borduration, notamment pour les bouches à clés.</p> <p>Délais et phasage :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pose canalisation principale sur le lotissement + PE antennes : env. 1 semaine Pose des citerneaux, chambres : env. 3 jours Essais bacterio et pression + Mise en eau du réseau. : Résultats bactério sous 5 jours 	PM	EIFFAGE
CR11	Un point a été fait le 20/10 en réunion avec Monsieur WALLOIS.	20/10	VEOLIA
CR4	Il sera prévu 1 chambre AEP 80x80 par collectif (soit 3 chambres)	PM	
	VERDI rappelle la présence d'eau pouvant compliquer les travaux de terrassements et de pose des canalisations.		
	<u>Télécom</u>		
CR12	Envisager la pose de la chambre L4T qu'en 2 ^{ème} phase.	PM	
CR11	Un point a été fait le 20/10 en réunion avec Monsieur KRAUZE. Il a été décidé / rappelé :	20/10	ORANGE
	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir la mutualisation du génie civil télécom et fibre Prévoir remplacement des L2T (x2) par une L3T Prévoir la mise en place d'une L4T en limite de propriété VERDI indique que cette chambre sera posée sur un lit de gravette. M. KRAUZE n'a omis aucune objection à cette solution Prévoir la mise en place de L1T pour les collectifs (x3) Les tampons des chambres ne devront ni être logotée France Telecom ni Orange (juste Telecom) Prévoir une botte de 5 fourreaux PVC 42/45 pour la tranchée commune et 2 fourreaux PVC 42/45 pour les antennes Prévoir la mise en place d'une boite béton 30x30 en limite de propriété (côté privé) – Pas de coffrets télécom dans les murets techniques + 1 chambre 80x80 par collectif ORANGE a fourni un plan annoté à EIFFAGE – Pour prise en compte dans les plans EXE ORANGE valide le raccordement sur la chambre rue de Dieppe (dito marché) 	PM	
CR3	Monsieur KRAUZE a indiqué qu'il fallait prévoir une chambre L5T en limite de parcelle, permettant d'accueillir le télécom et la fibre.	PM	EIFFAGE
	<u>COMPENSATION ZONE HUMIDE</u>		
CR3	Une visite du site a été faite avec LOISELEUR et VERDI.		
	LOISELEUR devra voir avec la mairie pour l'accès au site.	Juin 2016	Loiseleur

CR n°	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
-------	---------	---------	----------------------

RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, PLUS ET MOINS VALUES

N° Devis	Lot / Entreprise	Désignation	Montant HT	Validation
	Lot 2 / EIFFAGE	Optimisation génie civil télécom	-9 608,20 €	En cours
	Lot 2 / EIFFAGE	Re profilage suite tassement (quantités à affiner)	16 599,00 €	En cours
16/395	Lot 2 / EIFFAGE	Mise en place d'une chambre L4T	940 €	En cours
16/389	Lot 2 / EIFFAGE	PV pour géotextile R+S dito demande FONDASOL	5 523,70 €	En cours
16/319	Lot 2 / EIFFAGE	Substitution de sols	105 922,52 €	En cours
16/227	Lot 2 / EIFFAGE	Remplacement des vannes VACUFLOW (Barriquand) par des vannes AIRVAC (SOC)	18 900,00 €	En cours
16/2111	Lot 2 / EIFFAGE	Voirie d'accès à la pâture sud	7 150,40 €	En cours
16/210	Lot 1 – Lot 2	Empierrement des plates formes bâtiment	72 674 €	En cours

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Ouverture des TC débutée le 18/01/2017

